

Travaux sur la Nationale 4 : premières informations


Le chantier de réhabilitation et de sécurisation de la N4 à Tenneville débutera le 1^{er} avril prochain. Voici les premières informations concernant ce chantier.

Le chantier :

- ⇒ Société adjudicataire : l'Entreprise SOCOGETRA.
- ⇒ Début des travaux : au 1^{er} avril 2019 (Et ce n'est pas un poisson !)
- ⇒ Délai d'exécution : 300 jours ouvrables soit suivant les conditions climatiques de l'ordre de 2 années.
- ⇒ Les travaux débiteront par le raclage de la chaussée sur toute sa largeur.
- ⇒ La pose de l'aqueduc central de récolte des eaux de ruissellement est prévue en 8 phases. Les tronçons 1 à 4, soit du pont de la N4 d'Ortheuville jusqu'à l'arrêt-bus près de la maison communale, seront entrepris simultanément par 4 équipes de la société et sont prévus avant les congés annuels. Ensuite suivront les tronçons 5 puis 6 à 8 après les congés.

La circulation :

- ⇒ Durant les travaux, une zone demi-tour sera préservée à hauteur du parking de l'église et permettra l'accès à la place et au complexe scolaire, aux services et aux commerces. Après cette zone, il n'est plus prévu d'ouverture pour effectuer une manœuvre vers la gauche. Il sera imposé de sortir à la route de Lavacherie, puis de passer sur le pont d'Ortheuville pour reprendre la N4 dans le sens Bastogne-Marche.
- ⇒ L'accès aux habitations pour tous les riverains et usagers sera possible et maintenu pour autant que chacun respecte les consignes de circulation.
- ⇒ Nous vous demandons de faire preuve de sagesse et de respecter les contraintes imposées par le chantier.



Phasage du chantier :

⇒ PHASE 1

La première phase devrait durer jusque dans le courant de l'hiver 2019.

Pendant cette phase, la circulation sera maintenue sur une voie dans chaque sens (en utilisant la voie la plus extérieure pour chaque sens de circulation) avec une vitesse limitée. Un passage sera possible pour les véhicules aux environs de l'église.

⇒ PHASE 2

La circulation sera toujours maintenue sur une voie dans chaque sens mais cette fois tout le trafic sera accueilli sur les voies qui accueillent habituellement le trafic vers Bastogne. La vitesse sera limitée. Un passage sera toujours possible pour les véhicules aux environs de l'église.

Cette phase pourrait débuter fin de l'année 2019 ou au printemps 2020. Elle devrait durer environ 8 mois, sous réserve des conditions météorologiques.

⇒ PHASE 3


Des déviations devront être mises en place. Une voie restera disponible dans l'autre sens, vers Marche, avec une vitesse limitée.

Contact :

Marc GAUTHIER, 1^{er} échevin :
0495/52.63.67

Pour toute remarque
ou suggestion :
marc.gauthier@tenneville.be



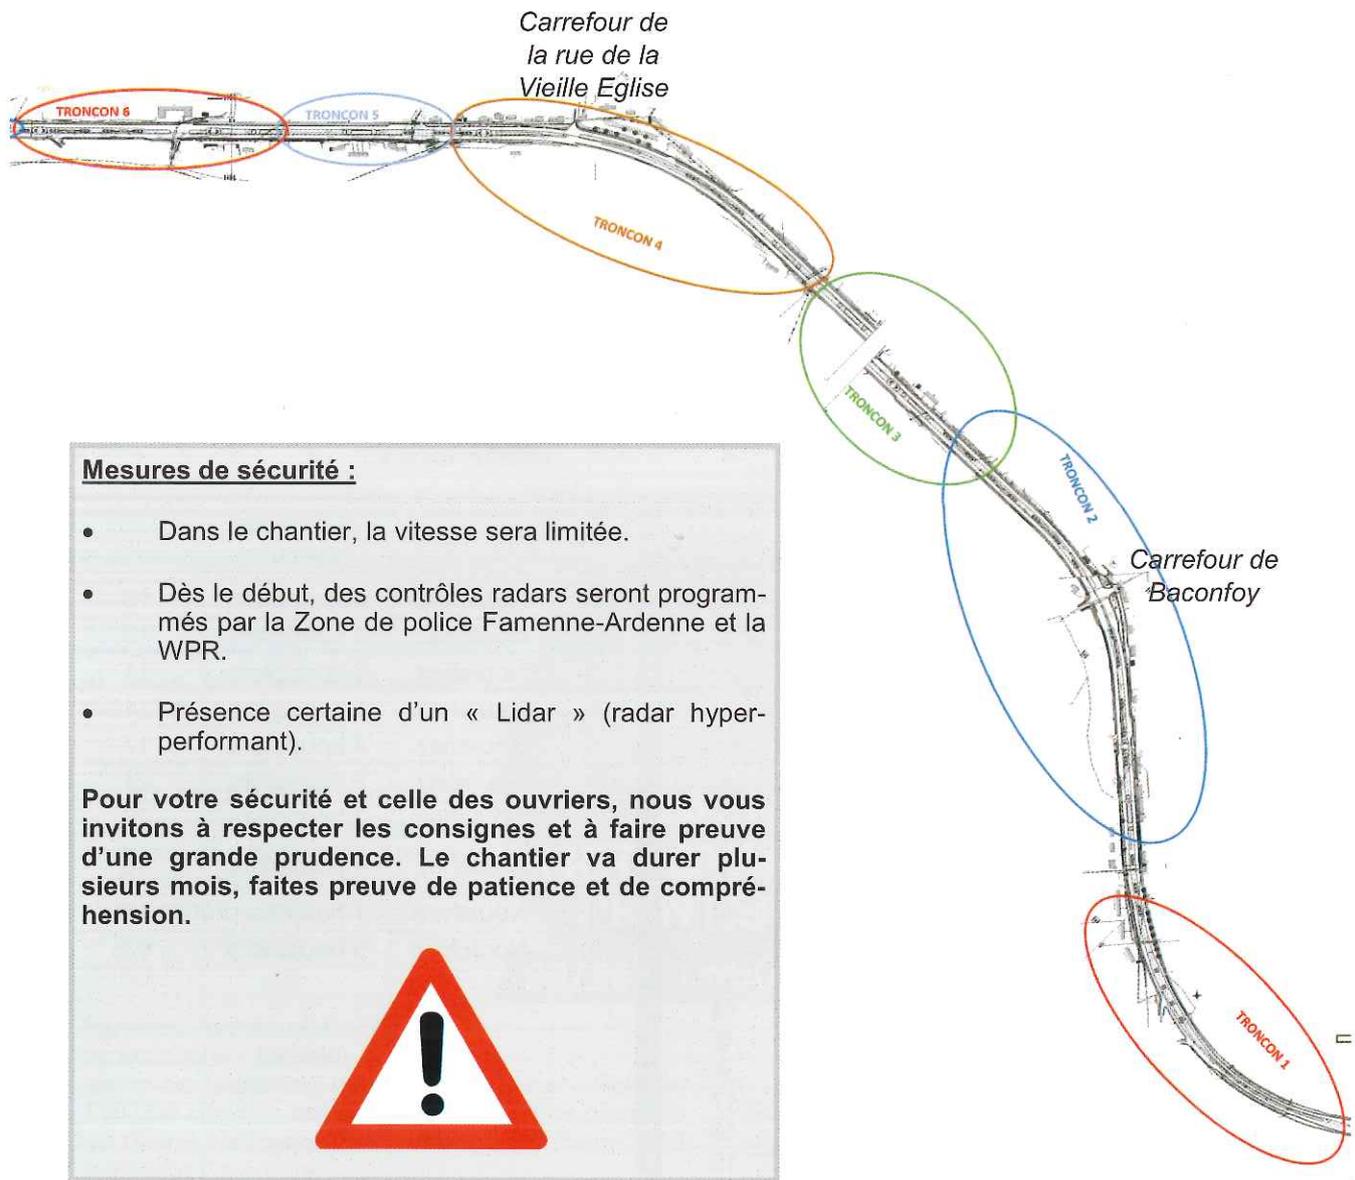

Mesures de sécurité :

- Dans le chantier, la vitesse sera limitée.
- Dès le début, des contrôles radars seront programmés par la Zone de police Famenne-Ardenne et la WPR.
- Présence certaine d'un « Lidar » (radar hyper-performant).

Pour votre sécurité et celle des ouvriers, nous vous invitons à respecter les consignes et à faire preuve d'une grande prudence. Le chantier va durer plusieurs mois, faites preuve de patience et de compréhension.

